

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish							
						H2	2021 H1	H2	2022 H1	H2	2023 H1	H2
1		Proiectare si Executie ,, Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti(km 8+700-km25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260)"	1095 days	Mon 25/01/21	Wed 24/01/24	[Timeline bar from 2021 H1 to 2024 H1]						
2		ORDIN INCEPERE	1 day	Mon 25/01/21	Mon 25/01/21	[Timeline bar]						
3		Predare amplasament	120 day	Tue 26/01/21	Tue 25/05/21	[Timeline bar]						
4		Predare amplasament subsectiunea 3A2	0 days	Wed 10/02/21	Wed 10/02/21	[Timeline bar]						
5		Predare amplasament subsectiunea 3B1	120 day	Tue 26/01/21	Tue 25/05/21	[Timeline bar]						
6		ETAPA DE PROIECTARE A CONTRACTULUI [INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA]	364 day	Tue 26/01/21	Mon 24/01/22	[Timeline bar with 364 days label]						
7		Proiectarea	364 day	Tue 26/01/21	Mon 24/01/22	[Timeline bar]						
8		Predarea Proiectului pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) la Supervisor si Beneficiar conform cubclauzei 19.2 din Condițiile de Contract	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
9		Aprobare PAC de catre Supervisor (inclusiv avizarea de catre Beneficiar) conform sub-clauzei 19.2 din conditiile de contract	42 days	Tue 01/06/21	Mon 12/07/21	[Timeline bar]						
10		Predarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie la Supervisor si Beneficiar conform sub-clauzei 19.2 din Condițiile de Contract	322 days	Tue 26/01/21	Mon 13/12/21	[Timeline bar]						
11		Aprobarea Proiectului Tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre Supervisor (inclusiv avizarea de catre Beneficiar) conform sub-clauzei 19.2 din Condițiile de Contract	42 days	Tue 14/12/21	Mon 24/01/22	[Timeline bar]						
12	✓	Punct de referinta nr. 1	56 days	Tue 26/01/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar with 56 days label]						
13	✓	Tot personalului cheie a Proiectantului este mobilizat	56 days	Tue 26/01/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar]						
14	✓	Identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata.Este stabilit programul cercetarilor arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice respectiv ..	56 days	Tue 26/01/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar]						
15	✓	Identificarea retelelor de utilitati	56 days	Tue 26/01/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar]						
16	✓	Documentatia pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	56 days	Tue 26/01/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar]						
17	✓	Programul de Executie detaliat al intregului Contract, in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, este finalizat si acceptat de catre Supervisor, devenind astfel Programul de Referinta	56 days	Tue 26/01/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar]						
18		Punct de referinta nr. 2	126 day	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar with 126 days label]						
19		Punctul de referinta nr. 1 este indeplinit in totalitate	0 days	Mon 22/03/21	Mon 22/03/21	[Timeline bar]						
20		Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
21		Predare la Supervisor si Beneficiar, Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Constructie (PAC), in conformitate cu Legea 10/1995 (documentatie vizata de verificator proiect atestat)	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
22		Studii de teren - Finalizare raport studiu geotehnic	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
23		Studii de teren - Finalizare raport studiu geologic	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
24	✓	Studii de teren - Finalizare raport studii hidrologice si hidrogeotehnice	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
25		Studii de teren - Finalizare raport studii topografice si de stabilitate ale terenului	126 days	Tue 26/01/21	Mon 31/05/21	[Timeline bar]						
26		Punct de referinta nr. 3	168 day	Tue 26/01/21	Mon 12/07/21	[Timeline bar with 168 days label]						

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si
3B1 - Mihaiesti - Zimbor
Date: Fri 28/05/21

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	2022					2024								
						H2	2021	H2	H1	H2	H1	H2	H1						
59		Structura rutiera	351 day	Sun 12/06/22	Sun 28/05/23														
60		Strat de forma	20 days	Sun 12/06/22	Fri 01/07/22														
61		Fundatie de balast	20 days	Sat 02/07/22	Thu 21/07/22														
62		Strat din agregate naturale stabilizate	60 days	Fri 22/07/22	Mon 19/09/22														
63		Strat de baza din mixtura asfaltica	60 days	Tue 20/09/22	Fri 18/11/22														
64		Strat de legatura - Binder cu bitum modificat BAD 25	30 days	Mon 20/03/23	Tue 18/04/23														
65		Strat de uzura - Mixtura asfaltica cu fibre si bitum modificat, MAS16	40 days	Wed 19/04/23	Sun 28/05/23														
66		Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri)	558 day	Mon 09/05/22	Fri 17/11/23														
67		Lucrari de drenaj	189 day	Mon 09/05/22	Fri 17/11/23														
68		Parapete si imprejmuiri [lucrari de drum]	183 day	Mon 29/05/22	Mon 27/11/23														
69		Parapeti de siguranta rutiera	104 days	Mon 29/05/23	Mon 27/11/23														
70		Semnalizare rutiera	169 day	Mon 19/06/22	Mon 04/12/23														
71		Semnalizare rutiera	100 day	Mon 19/06/23	Mon 04/12/23														
72		LUCRARI DE CONSOLIDARE	251 day	Tue 25/01/22	Sun 02/10/22														
73		Lucrari consolidare	251 day	Tue 25/01/22	Sun 02/10/22														
74		LUCRARI DE ARTA	633 day	Tue 25/01/22	Thu 19/10/23														
75		1. Viaduct km 9+213	597 days	Tue 25/01/22	Wed 13/09/23														
76		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	210 days	Tue 25/01/22	Mon 22/08/22														
77		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	236 days	Wed 20/04/22	Mon 27/03/23														
78		Structura de rezistenta	100 days	Tue 28/03/23	Wed 05/07/23														
79		Racordari cu terasamentele	70 days	Thu 06/07/23	Wed 13/09/23														
80		cale+trotuar+parapet	47 days	Fri 14/07/23	Tue 29/08/23														
81		2. Pasaj km 10+080	241 days	Fri 04/02/22	Sun 02/10/22														
82		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	80 days	Fri 04/02/22	Sun 24/04/22														
83		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	63 days	Mon 25/04/22	Sun 26/06/22														
84		Structura de rezistenta	60 days	Mon 27/06/22	Thu 25/08/22														
85		Racordari cu terasamentele	30 days	Fri 26/08/22	Sat 24/09/22														
86		cale+trotuar+parapet	28 days	Mon 05/09/22	Sun 02/10/22														
87		3. Viaduct km 11+560	284 days	Mon 14/02/22	Thu 24/11/22														
88		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	125 days	Mon 14/02/22	Sat 18/06/22														
89		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	84 days	Fri 15/04/22	Thu 07/07/22														
90		Structura de rezistenta	70 days	Fri 08/07/22	Thu 15/09/22														
91		Racordari cu terasamentele	60 days	Fri 16/09/22	Mon 14/11/22														
92		cale+trotuar+parapet	60 days	Mon 26/09/22	Thu 24/11/22														
93		4. Viaduct km 12+143	428 days	Thu 24/02/22	Thu 27/04/23														
94		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	149 days	Thu 24/02/22	Fri 22/07/22														
95		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	80 days	Sat 23/07/22	Mon 10/10/22														
96		Structura de rezistenta	70 days	Tue 11/10/22	Mon 19/12/22														
97		Racordari cu terasamentele	60 days	Mon 27/02/23	Thu 27/04/23														
98		cale+trotuar+parapet	40 days	Thu 09/03/23	Mon 17/04/23														
99		5. Pod km 12+987	418 days	Sun 06/03/22	Thu 27/04/23														
100		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	115 days	Sun 06/03/22	Tue 28/06/22														
101		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	80 days	Wed 29/06/22	Fri 16/09/22														
102		Structura de rezistenta	70 days	Sat 17/09/22	Fri 25/11/22														

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si

3B1 - Mihaiesti - Zimbor

Date: Fri 28/05/21

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	2021					2022		2023		2024
						H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
103		Racordari cu terasamentele	60 days	Mon 27/02/23	Thu 27/04/23										
104		cale+trotuar+parapet	50 days	Thu 09/03/23	Thu 27/04/23										
105		6. Pasaj inferior km 13+881	220 days	Wed 16/03/22	Fri 21/10/22										
106		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	90 days	Wed 16/03/22	Mon 13/06/22										
107		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	50 days	Tue 14/06/22	Tue 02/08/22										
108		Structura de rezistenta	40 days	Wed 03/08/22	Sun 11/09/22										
109		Racordari cu terasamentele	30 days	Mon 12/09/22	Tue 11/10/22										
110		cale+trotuar+parapet	30 days	Thu 22/09/22	Fri 21/10/22										
111		7. Pod km 14+110	423 days	Sat 26/03/22	Mon 22/05/23										
112		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	144 days	Sat 26/03/22	Tue 16/08/22										
113		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	80 days	Wed 17/08/22	Fri 04/11/22										
114		Structura de rezistenta	29 days	Sat 05/11/22	Thu 23/03/23										
115		Racordari cu terasamentele	60 days	Fri 24/03/23	Mon 22/05/23										
116		cale+trotuar+parapet	40 days	Mon 03/04/23	Fri 12/05/23										
117		8. Viaduct km 14+609	291 days	Tue 25/01/22	Fri 11/11/22										
118		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	200 days	Tue 25/01/22	Fri 12/08/22										
119		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	81 days	Wed 16/03/22	Sat 04/06/22										
120		Structura de rezistenta	90 days	Sun 05/06/22	Fri 02/09/22										
121		Racordari cu terasamentele	70 days	Sat 03/09/22	Fri 11/11/22										
122		cale+trotuar+parapet	50 days	Tue 13/09/22	Tue 01/11/22										
123		9. Pod km 16+227	614 days	Fri 04/02/22	Tue 10/10/23										
124		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	280 days	Fri 04/02/22	Thu 10/11/22										
125		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	160 days	Mon 08/08/22	Sat 13/05/23										
126		Structura de rezistenta	80 days	Sun 14/05/23	Tue 01/08/23										
127		Racordari cu terasamentele	70 days	Wed 02/08/23	Tue 10/10/23										
128		cale+trotuar+parapet	60 days	Sat 12/08/23	Tue 10/10/23										
129		10. Pod km 17+589	269 days	Mon 14/02/22	Wed 09/11/22										
130		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	127 days	Mon 14/02/22	Mon 20/06/22										
131		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	20 days	Tue 21/06/22	Sun 10/07/22										
132		Structura de rezistenta	60 days	Mon 11/07/22	Fri 09/09/22										
133		Racordari cu terasamentele	60 days	Sat 10/09/22	Wed 09/11/22										
134		cale+trotuar+parapet	40 days	Tue 20/09/22	Sat 29/10/22										
135		11. Pod km 18+223	123 days	Thu 24/02/22	Sun 26/06/22										
136		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	40 days	Thu 24/02/22	Mon 04/04/22										
137		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	40 days	Fri 11/03/22	Thu 21/04/22										
138		Structura de rezistenta	31 days	Fri 22/04/22	Sun 22/05/22										
139		Racordari cu terasamentele	20 days	Mon 23/05/22	Sat 11/06/22										
140		cale+trotuar+parapet	15 days	Sun 12/06/22	Sun 26/06/22										
141		12. Pod km 18+500	126 days	Sun 06/03/22	Sat 09/07/22										
142		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	43 days	Sun 06/03/22	Sun 17/04/22										
143		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	43 days	Mon 21/03/22	Mon 02/05/22										
144		Structura de rezistenta	30 days	Tue 03/05/22	Wed 01/06/22										
145		Racordari cu terasamentele	20 days	Thu 02/06/22	Fri 24/06/22										
146		cale+trotuar+parapet	15 days	Sat 25/06/22	Sat 09/07/22										
147		13. Pod km 18+845	262 days	Wed 16/03/22	Fri 02/12/22										

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si 3B1 - Mihaiesti - Zimbor Date: Fri 28/05/21	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish						2024	
						H2	2021	H2	2022	2023	2024	
							H1		H1	H2	H1	H1
148		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	84 days	Wed 16/03/22	Tue 07/06/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%
149		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	80 days	Wed 08/06/22	Tue 30/08/22							Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%]
150		Structura de rezistenta	50 days	Wed 31/08/22	Sun 23/10/22							Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa
151		Racordari cu terasamentele	30 days	Mon 24/10/22	Tue 22/11/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna
152		cale+trotuar+parapet	30 days	Thu 03/11/22	Fri 02/12/22							Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Munc
153		14. Pod km 20+088	279 days	Sat 26/03/22	Thu 29/12/22							14. Pod km 20+088
154		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	120 days	Sat 26/03/22	Sun 24/07/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa
155		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	180 days	Mon 04/04/22	Fri 30/09/22							Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10
156		Structura de rezistenta	80 days	Sat 01/10/22	Tue 20/12/22							Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cistern
157		Racordari cu terasamentele	60 days	Mon 31/10/22	Thu 29/12/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Ciste
158		cale+trotuar+parapet	50 days	Thu 10/11/22	Thu 29/12/22							Autobetoniera,Muncitori calificati[300%],M
159		15. Pod km 21+314	321 days	Tue 25/01/22	Sun 11/12/22							15. Pod km 21+314
160		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	130 days	Tue 25/01/22	Fri 03/06/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%
161		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	79 days	Sat 04/06/22	Sun 21/08/22							Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],
162		Structura de rezistenta	60 days	Mon 22/08/22	Fri 21/10/22							Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa
163		Racordari cu terasamentele	50 days	Sat 22/10/22	Sun 11/12/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cistern
164		cale+trotuar+parapet	40 days	Tue 01/11/22	Sat 10/12/22							Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Mun
165		16. Pod km 22+609	375 days	Sat 04/06/22	Tue 13/06/23							16. Pod km 22+609
166		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	95 days	Sat 04/06/22	Tue 06/09/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna
167		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	70 days	Wed 07/09/22	Wed 16/11/22							Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara
168		Structura de rezistenta	60 days	Thu 17/11/22	Mon 16/01/23							Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Ciste
169		Racordari cu terasamentele	50 days	Mon 24/04/23	Tue 13/06/23							Autobasculanta[200%],Autobe
170		cale+trotuar+parapet	25 days	Thu 04/05/23	Sun 28/05/23							Autobetoniera[50%],Muncitori
171		17. Pod km 23+821	367 days	Wed 07/09/22	Fri 08/09/23							17. Pod km 23+821
172		Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei	120 days	Wed 07/09/22	Wed 21/06/23							Autobasculanta[200%],Autob
173		Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei	80 days	Mon 22/05/23	Thu 10/08/23							Autobetoniera[50%],Ciste
174		Structura de rezistenta	69 days	Thu 04/05/23	Tue 11/07/23							Autobetoniera[50%],Autoba
175		Racordari cu terasamentele	59 days	Wed 12/07/23	Fri 08/09/23							Autobasculanta[200%],
176		cale+trotuar+parapet	25 days	Sat 22/07/23	Tue 15/08/23							Autobetoniera[50%],Mun
177		18. Pasaj pe D.E peste autostrada km 0+880,	78 days	Sun 06/03/22	Sun 22/05/22							18. Pasaj pe D.E peste autostrada km 0+880,
178		Lucrari la infrastructura - fundatii	30 days	Sun 06/03/22	Mon 04/04/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Ex
179		Lucrari la infrastructura -elevatii	20 days	Tue 05/04/22	Sun 24/04/22							Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori
180		Lucrari la suprastructura	20 days	Mon 25/04/22	Sat 14/05/22							Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[17%],Maca
181		Racordari cu terasamentele	20 days	Mon 25/04/22	Sat 14/05/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Mun
182		cale+trotuar+parapet	18 days	Thu 05/05/22	Sun 22/05/22							Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati
183		19. Viaduct pe autostrada peste paraul Borlacului, km 1+360 - km 1+721.40	491 days	Fri 11/03/22	Fri 14/07/23							19. Viaduct pe autostrada
184		Lucrari la infrastructura - fundatii	100 days	Fri 11/03/22	Sat 18/06/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20
185		Lucrari la infrastructura -elevatii	170 day	Sun 19/06/22	Mon 05/12/22							Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Maca
186		Lucrari la suprastructura	140 days	Tue 06/12/22	Wed 14/06/23							Autobetoniera[50%],Autobasc
187		Racordari cu terasamentele	30 days	Wed 26/04/23	Thu 25/05/23							Autobasculanta[200%],Autobet
188		cale+trotuar+parapet	30 days	Thu 15/06/23	Fri 14/07/23							Autobetoniera[50%],Munci
189		20. Viaduct pe autostrada peste afluent Valea Pustei, km 1+870.36 - km 2+231.78	573 days	Sat 26/03/22	Thu 19/10/23							20. Viaduct pe auto
190		Lucrari la infrastructura - fundatii	80 days	Sat 26/03/22	Mon 13/06/22							Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si 3B1 - Mihaiesti - Zimbor Date: Fri 28/05/21	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			


ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	2021					2022		2023		2024
						H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
191		Lucrari la infrastructura -elevatii	220 day	Tue 14/06/22	Thu 01/06/23										
192		Lucrari la suprastructura	170 days	Mon 03/04/23	Tue 19/09/23										
193		Racordari cu terasamentele	30 days	Wed 12/07/23	Thu 10/08/23										
194		cale+trotuar+parapet	30 days	Wed 20/09/23	Thu 19/10/23										
195		21. Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada - km 3+715	72 days	Tue 05/04/22	Wed 15/06/22										
196		Lucrari la infrastructura - fundatii	18 days	Tue 05/04/22	Fri 22/04/22										
197		Lucrari la infrastructura -elevatii	24 days	Sat 23/04/22	Mon 16/05/22										
198		Lucrari la suprastructura	20 days	Tue 17/05/22	Sun 05/06/22										
199		Racordari cu terasamentele	14 days	Sun 22/05/22	Sat 04/06/22										
200		cale+trotuar+parapet	10 days	Mon 06/06/22	Wed 15/06/22										
201		22. Viaduct pe autostrada peste Valea Pustei, km 4+085.61 - km 4+607.03	497 days	Thu 24/02/22	Wed 05/07/23										
202		Lucrari la infrastructura - fundatii	80 days	Thu 24/02/22	Mon 16/05/22										
203		Lucrari la infrastructura -elevatii	100 day	Tue 17/05/22	Wed 24/08/22										
204		Lucrari la suprastructura	99 days	Thu 25/08/22	Mon 01/05/23										
205		Racordari cu terasamentele	45 days	Mon 22/05/23	Wed 05/07/23										
206		cale+trotuar+parapet	60 days	Tue 02/05/23	Fri 30/06/23										
207		23. Viaduct pe autostrada peste Valea Bobii, km 5+360 - km 5+603.50	308 days	Thu 24/02/22	Wed 28/12/22										
208		Lucrari la infrastructura - fundatii	79 days	Thu 24/02/22	Fri 13/05/22										
209		Lucrari la infrastructura -elevatii	100 day	Sat 14/05/22	Sun 21/08/22										
210		Lucrari la suprastructura	99 days	Mon 22/08/22	Mon 28/11/22										
211		Racordari cu terasamentele	45 days	Sat 01/10/22	Mon 14/11/22										
212		cale+trotuar+parapet	30 days	Tue 29/11/22	Wed 28/12/22										
213		24. Viaduct pe autostrada peste paraul Silistea, km 7+124 - km 7+725.50	270 days	Sun 06/03/22	Wed 30/11/22										
214		Lucrari la infrastructura - fundatii	51 days	Sun 06/03/22	Mon 25/04/22										
215		Lucrari la infrastructura -elevatii	110 day	Tue 26/04/22	Sat 13/08/22										
216		Lucrari la suprastructura	119 days	Sun 05/06/22	Sat 01/10/22										
217		Racordari cu terasamentele	40 days	Mon 25/07/22	Fri 02/09/22										
218		cale+trotuar+parapet	60 days	Sun 02/10/22	Wed 30/11/22										
219		25. Pasaj pe autostrada peste DC58, KM 12+427 - km 12+445.10	193 days	Tue 26/04/22	Fri 04/11/22										
220		Lucrari la infrastructura - fundatii	32 days	Tue 26/04/22	Fri 27/05/22										
221		Lucrari la infrastructura -elevatii	52 days	Sat 28/05/22	Mon 18/07/22										
222		Lucrari la suprastructura	79 days	Tue 19/07/22	Wed 05/10/22										
223		Racordari cu terasamentele	20 days	Thu 18/08/22	Tue 06/09/22										
224		cale+trotuar+parapet	30 days	Thu 06/10/22	Fri 04/11/22										
225		26. Pod pe autostrada peste Paraul Almas, km 12+544 - km 12+585.07	148 days	Thu 28/04/22	Thu 22/09/22										
226		Lucrari la infrastructura - fundatii	38 days	Thu 28/04/22	Sat 04/06/22										
227		Lucrari la infrastructura -elevatii	62 days	Sun 05/06/22	Fri 05/08/22										
228		Lucrari la suprastructura	80 days	Tue 05/07/22	Thu 22/09/22										
229		Racordari cu terasamentele	32 days	Thu 04/08/22	Sun 04/09/22										
230		cale+trotuar+parapet	35 days	Fri 19/08/22	Thu 22/09/22										
231		27. Pasaj pe autostrada peste Bretea, km 12+787 - km 12+808.10	190 days	Wed 16/03/22	Wed 21/09/22										
232		Lucrari la infrastructura - fundatii	31 days	Wed 16/03/22	Fri 15/04/22										
233		Lucrari la infrastructura -elevatii	50 days	Sat 16/04/22	Sat 04/06/22										

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si 3B1 - Mihaiesti - Zimbor Date: Fri 28/05/21	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	Gantt Chart											
						H2	2021		2022		2023		2024				
						H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
234		Lucrari la suprastructura	79 days	Sun 05/06/22	Mon 22/08/22												
235		Racordari cu terasamentele	36 days	Wed 20/07/22	Wed 24/08/22												
236		cale+trotuar+parapet	30 days	Tue 23/08/22	Wed 21/09/22												
237		28. Pasaj pe autostrada peste D.N 1G, km 13+105 - km 13+126.10	198 days	Thu 05/05/22	Fri 18/11/22												
238		Lucrari la infrastructura - fundatii	39 days	Thu 05/05/22	Sun 12/06/22												
239		Lucrari la infrastructura -elevatii	50 days	Mon 13/06/22	Mon 01/08/22												
240		Lucrari la suprastructura	79 days	Tue 02/08/22	Wed 19/10/22												
241		Racordari cu terasamentele	25 days	Fri 23/09/22	Mon 17/10/22												
242		cale+trotuar+parapet	30 days	Thu 20/10/22	Fri 18/11/22												
243		PODETE	70 days	Tue 12/07/22	Mon 19/09/22												
244		LUCRARI HIDROTEHNICE	100 day	Wed 12/07/22	Thu 19/10/23												
245		RESTABILIRI LEGATURI RUTIERE	18 days	Mon 29/05/23	Thu 15/06/23												
246		Restabiliri legaturi rutiere	18 days	Mon 29/05/23	Thu 15/06/23												
247		Terasamente	10 days	Mon 29/05/23	Wed 07/06/23												
248		Structura drumului	10 days	Sat 03/06/23	Mon 12/06/23												
249		Podete	10 days	Mon 29/05/23	Wed 07/06/23												
250		Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri)	10 days	Sat 03/06/23	Mon 12/06/23												
251		Parapete si imprejmuiri	10 days	Sat 03/06/23	Mon 12/06/23												
252		Siguranta circulatiei	3 days	Tue 13/06/23	Thu 15/06/23												
253		DRUMURI DE INTRETINERE	18 days	Tue 13/06/23	Fri 30/06/23												
254		Drumuri de intretinere	18 days	Tue 13/06/23	Fri 30/06/23												
255		Terasamente	10 days	Tue 13/06/23	Thu 22/06/23												
256		Structura drumului	10 days	Sun 18/06/23	Tue 27/06/23												
257		Podete	10 days	Sun 18/06/23	Tue 27/06/23												
258		Siguranta circulatiei-porti acces	3 days	Wed 28/06/23	Fri 30/06/23												
259		DRUMURI DE ACCES	10 days	Tue 13/06/23	Thu 22/06/23												
260		Drumuri de acces	10 days	Tue 13/06/23	Thu 22/06/23												
261		Terasamente	10 days	Tue 13/06/23	Thu 22/06/23												
262		Structura drumului	5 days	Sun 18/06/23	Thu 22/06/23												
263		Podete	3 days	Tue 20/06/23	Thu 22/06/23												
264		SISTEM DE COMUNICARE ITS	162 day	Mon 29/05/23	Mon 06/11/23												
265		ITS	162 day	Mon 29/05/23	Mon 06/11/23												
266		Sistem ITS pe Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti, km 8+700 - km 25+500 [conform Anexa 1 - Cerintele Beneficiarului - Specificatii Tehnice sisteme ITS]	162 days	Mon 29/05/23	Mon 06/11/23												
267		Sistem ITS pe Subsectiunea 3B1: Mihaiesti(Cj) - Zimbor(Sj), km 0+000 - km 13+260 [conform Anexa 1 - Cerintele Beneficiarului - Specificatii Tehnice sisteme ITS]	162 days	Mon 29/05/23	Mon 06/11/23												
268		NOD RUTIER KM 12+800-ZIMBOR	100 day	Mon 31/07/23	Tue 07/11/23												
269		Nod rutier Zimbor	100 day	Mon 31/07/23	Tue 07/11/23												
270		Terasamente	80 days	Mon 31/07/23	Wed 18/10/23												
271		Suprastructura drum	40 days	Tue 19/09/23	Sat 28/10/23												
272		Podete	5 days	Tue 24/10/23	Sat 28/10/23												
273		Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri)	10 days	Tue 24/10/23	Thu 02/11/23												
274		Parapete si imprejmuiri	10 days	Sun 29/10/23	Tue 07/11/23												
275		Siguranta circulatiei	10 days	Tue 24/10/23	Thu 02/11/23												

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si 3B1 - Mihaiesti - Zimbor Date: Fri 28/05/21	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish						2024	
						2021	2022	2023	2024	H1		
276	➔	ILUMINAT VIADUCTE SI NODURI RUTIERE	280 day	Thu 06/04/23	Wed 10/01/24							
277	➔	PARCARE DE SCURTA DURATA - KM 17+800 [stg+dr]	255 day	Tue 25/01/22	Thu 06/10/22							
278	➔	Parcare scurta durata	255 days	Tue 25/01/22	Thu 06/10/22							
279	➔	Arhitectura si constructii	184 days	Tue 25/01/22	Wed 27/07/22							
280	➔	Drumuri si platforme	50 days	Sat 26/03/22	Sat 14/05/22							
281	➔	Instalatii si echipamente	50 days	Sun 15/05/22	Sun 03/07/22							
282	➔	PARCARE DE SCURTA DURATA - KM 10+600 [stg+dr]	257 day	Mon 24/04/23	Fri 05/01/24							
283	➔	Parcare de scurta durata km 10+600	257 days	Mon 24/04/23	Fri 05/01/24							
284	➔	Arhitectura si constructii	184 days	Mon 24/04/23	Tue 24/10/23							
285	➔	Drumuri si platforme	50 days	Tue 13/06/23	Tue 01/08/23							
286	➔	Instalatii si echipamente	73 days	Wed 25/10/23	Fri 05/01/24							
287	➔	PUNCT DE SPRIJIN PENTRU INTRETINERE - KM 12+920	258 day	Tue 25/01/22	Sun 09/10/22							
288	➔	Punct de sprijin si intretinere km 12+920	258 days	Tue 25/01/22	Sun 09/10/22							
289	➔	Arhitectura si constructii	184 days	Tue 25/01/22	Wed 27/07/22							
290	➔	Drumuri si platforme	50 days	Sat 26/03/22	Sat 14/05/22							
291	➔	Instalatii si echipamente	50 days	Sun 15/05/22	Sun 03/07/22							
292	➔	LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI	471 day	Sun 14/08/22	Mon 27/11/23							
293	➔	Bazine de sedimentare, de dispersie, fitoepuratoare si separatoare de grasimi, produse petroliere	70 days	Tue 20/09/22	Mon 28/11/22							
294	➔	Panouri de protectie impotriva zgomotului	60 days	Fri 29/09/23	Mon 27/11/23							
295	➔	Lucrari de amenajare Peisagistica	50 days	Sun 14/08/22	Sun 02/10/22							
296	➔	AMENAJAREA TERENULUI	1028 day	Tue 26/01/21	Sun 19/11/23							
297	➔	Lucrari de deviere/mutari/relocari/protejari retele de utilitati	110 days	Mon 14/02/22	Fri 03/06/22							
298	➔	Finalizare investigatii arheologice - Supraveghere arheologica	364 days	Tue 26/01/21	Mon 24/01/22							
299	➔	Identificare si curatare teren de munitii neexplodate	30 days	Thu 08/04/21	Sun 23/05/21							
300	➔	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului	50 days	Sun 14/08/22	Sun 19/11/23							
301	➔	IMPREJMUIRI	120 day	Wed 02/08/23	Wed 29/11/23							
302	➔	Activitati necesare implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului (Placi permante, elaborare si publicare articole de presa etc.)	10 days	Thu 30/11/23	Sat 09/12/23							
303	➔	Probe tehnologice si Teste la terminare	44 days	Tue 07/11/23	Wed 20/12/23							
304	➔	Predarea documentelor conforme cu executia si a Manualelor de operare si intretinere detaliate, conform Cerintelor Beneficiarului	34 days	Thu 21/12/23	Tue 23/01/24							
305	➔	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	1 day	Wed 24/01/24	Wed 24/01/24							
306	➔	ORGANIZARE DE SANTIER - DEZAFECTARE	10 days	Sun 14/01/24	Tue 23/01/24							

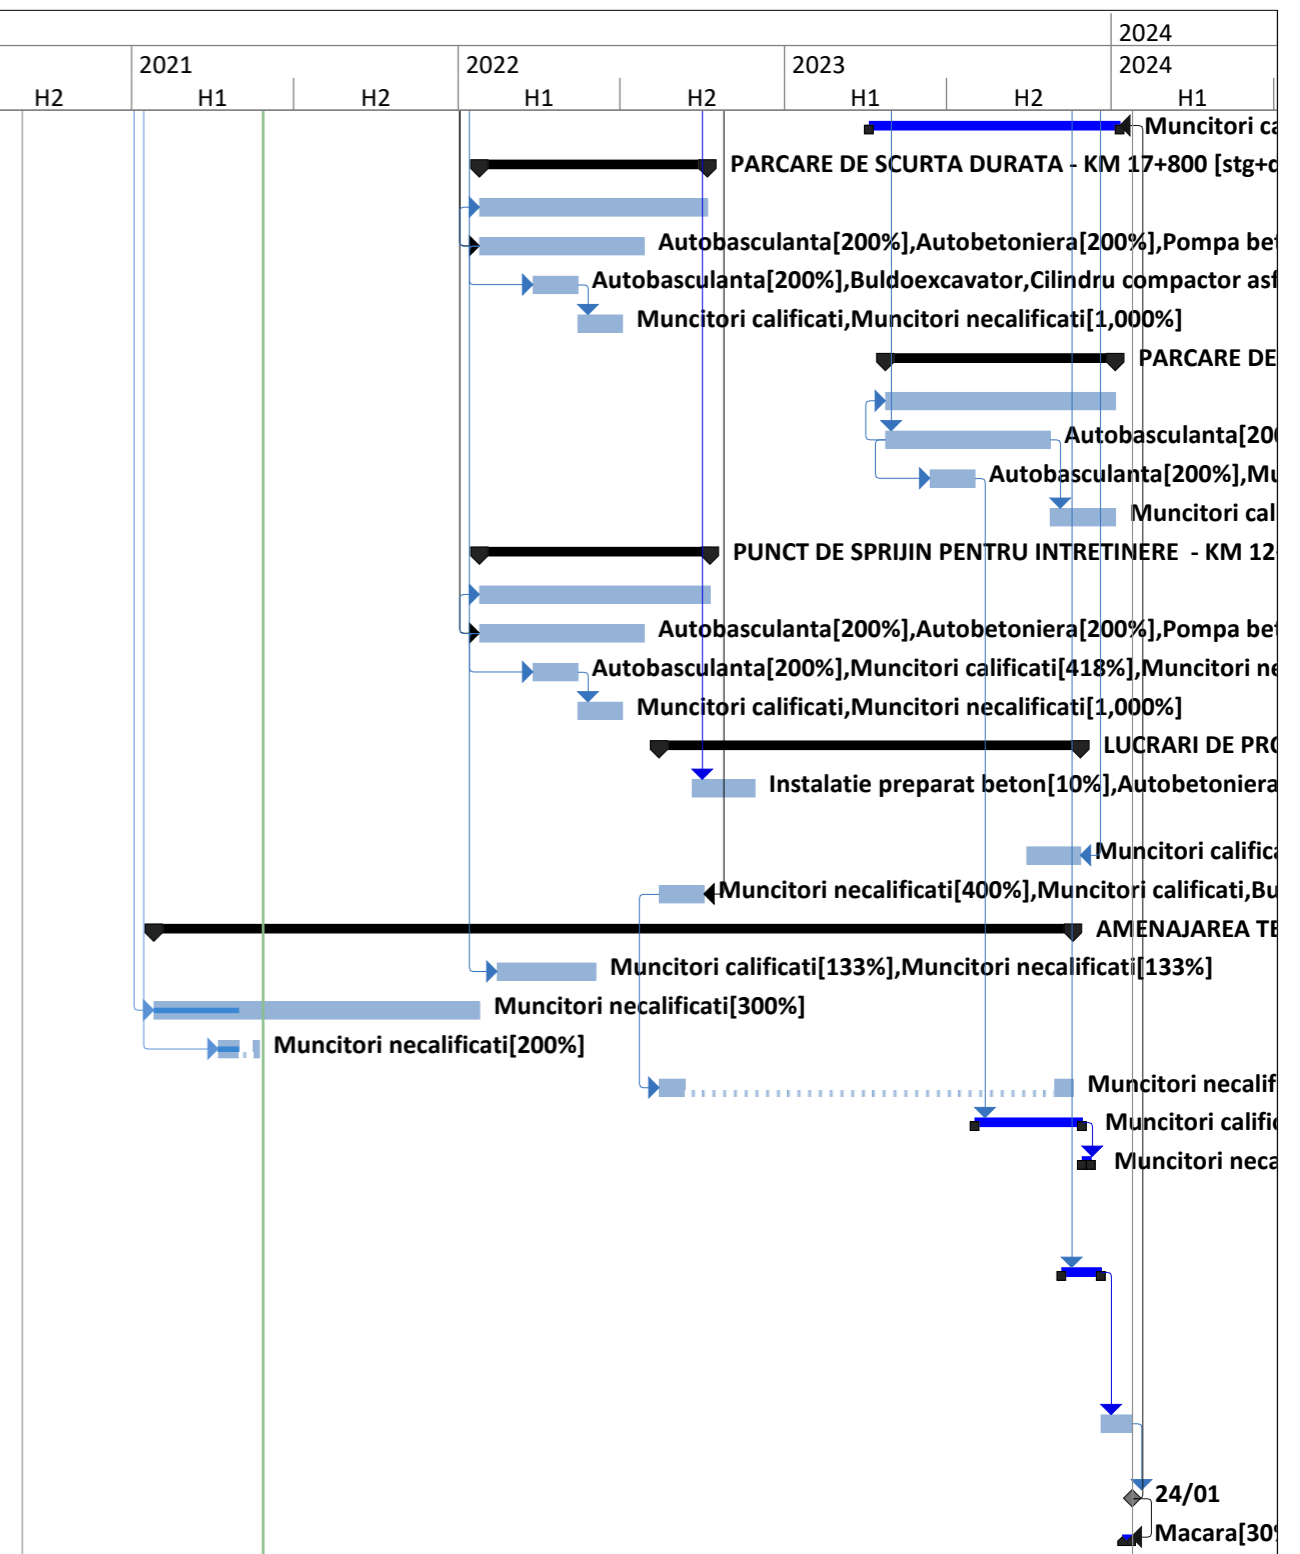

3A2 - Nadaselu - Mihalesti si
3B1 - Mihalesti - Zimbor
Date: Fri 28/05/21

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			
