


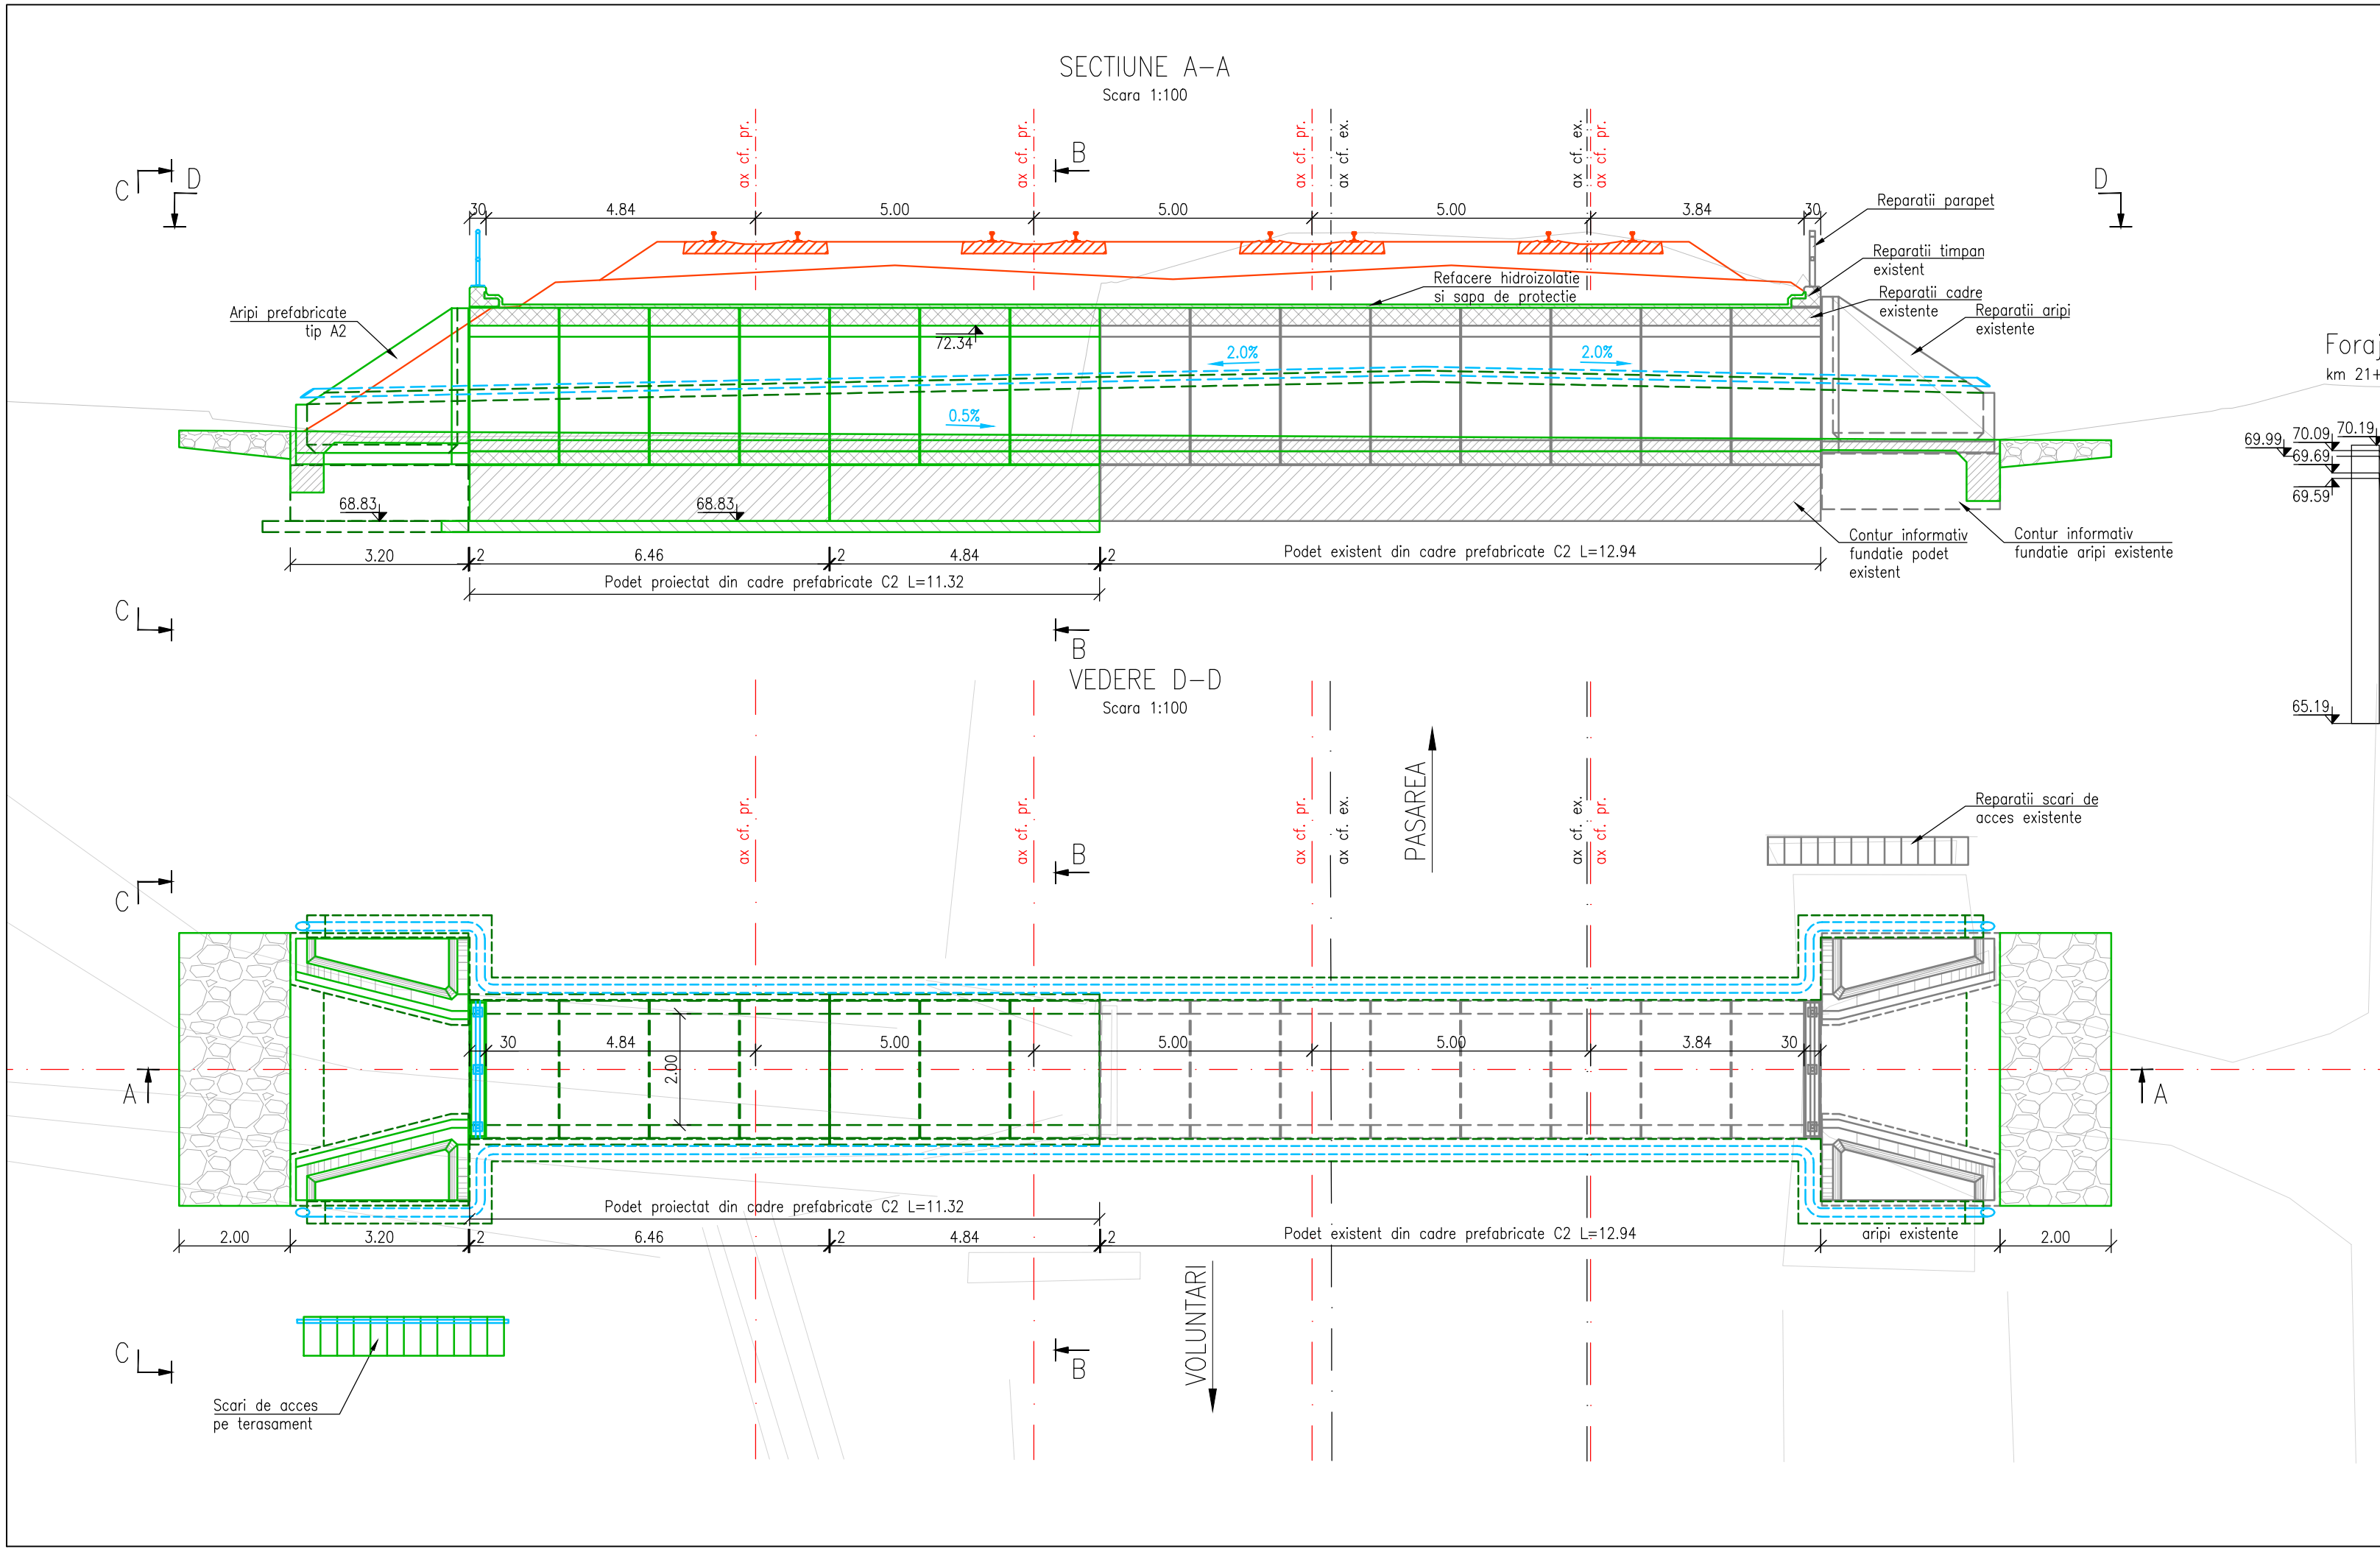

NOTA

Date de proiectare:

- Date puse la dispozitie de Beneficiar;
- Studiu topografic;
- Expertiza tehnica;
- Studiu geotehnic
- Date culese de pe teren (fotografii, masuratori, informatii relevante).

Situatia existenta:

Podetul existent este realizat din 8 elemente prefabricate din beton armat tip C2. Podetul sustine doua linii de cale ferata si are lumina de 2.00m. Racordarea cu terasamentul este realizata cu aripi prefabricate din beton armat.

Solutia proiectata:

Solutia proiectata, pe baza recomandarii expertului, consta in reparatia podetului existent. Se va realiza un inventar al tuturor degradarilor constatate la inspectia podetului. Se vor realiza lucrari de reparatii/consolidare/punere in conservare: camasieli, injectii (daca este cazul), refacerea hidroizolatiei si a protectiei acesteia, refacerea/repararea drenurilor, refaceri ale tencuielii, reparatii ale timpanelor, reparatii ale aripiilor, lucrari de decolmatare/curatare, amenajare, pereere a albiei etc.

Ca urmare a proiectarii a doua linii noi pe partea stanga, podetul existent va fi prelungit cu cadre prefabricate din beton armat tip C2 asezate pe o fundatie din beton armat.

Racordarea podetului proiectat cu terasamentul se va realiza cu aripi prefabricate din beton armat tip A2. In interiorul podetului si intre elementele de racordare se va realiza un pereu din beton.

Se vor monta scari de acces pe terasamente din beton, prevazute cu balustrada metalica.

Suprafetele din beton vizibile vor fi protejate cu substante impermeabilizante.

Conform H.G. 766/1997, podetul se incadreaza in categoria "B"-Constructie de importanta deosebita.

ENTITATE CONTRACTANTA CONTRACTING ENTITY		 C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.	
CONTRACTANT CONTRACTOR		 Asocierea S.C. ISPCF S.A. - S.C. BAICONS IMPEX SRL	
	Nume Name	Data Date	Semnatura Signature
Sef Proiect Project Manager	ing. GORGONEȚU Viorel	11.2024	
Verificat Checked	ing. SĂRĂCIN Michaiela	11.2024	
Proiectat Designed	ing. COJUHARI Vadim	11.2024	
"Modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București" Studiu de fezabilitate "Modernization lines and installations in the Bucharest Railway Complex Feasibility Study			Proiect / Project 38 / 2022
			Faza / Phase S.F. F.S.
Denumire / Title DISPOZIȚIE GENERALĂ PODEȚ km pr. 21+349 (km ex. 21+349)			Scara / Scale 1:100
Codificare / Codification System COBU SF CPD DDG 08 01 002 R00			
Istoricul reviziilor / Revision History			
Rev.	Data/Date	Descriere Modificare / Modification description	
1			
2			
3			
4			
