GRAFICUL DE EXECUȚIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAȚIILE ŞI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAȚIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

INTERVAL BOD Cap Y - FELDIOARA Cap X
KM 184+505 - KM 190+885

NR. CRT	CATEGORIILE DE LUCRĂRI	DURATA (ZILE)
	Executie varianta de viteză Feldioara 1 km 187+000 - 191+061 - 9 podețe, 1 pod, 1 viaduct	540
Fir I	Demolare pod existent km 184+837 şi construire pod nou D= 45 m	270
Fir I	Demontare şi mutare cabluri FO - lucrări TCF aferente Fir I	30
Fir I	Reabilitare Fir I (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) inclusiv legarea firului I proiectat pe varianta în firul I reabilitat zona km 187+000	270
Fir I	Legarea firului I proiectat cu firul I - linia IV directă proiectată stația Feldioara	90
Fir II	Demolare pod existent km 184+837 şi construire pod nou D= 45 m	270
Fir II	Demontare şi mutare cabluri FO lucrari TCF aferente Fir II	30
Fir II	Reabilitare Fir II (LC1 + Teras.+Supra+ LC 2) inclusiv legarea firului II proiectat varianta cu firul II reabilitat zona km 187+000	270
Fir II	Legarea firului II proiectat cu firul II - linia III directă proiectată stația Feldioara	120
Fir II	Lucrări de apărare terasamente - pod km 184+837	150
	Lucrări de semnalizare BLI aferente firului I	120
	Montarea cablului FO - şi lucrări la instalațiile de telecomunicații feroviare pe amplasamentul definitiv	120

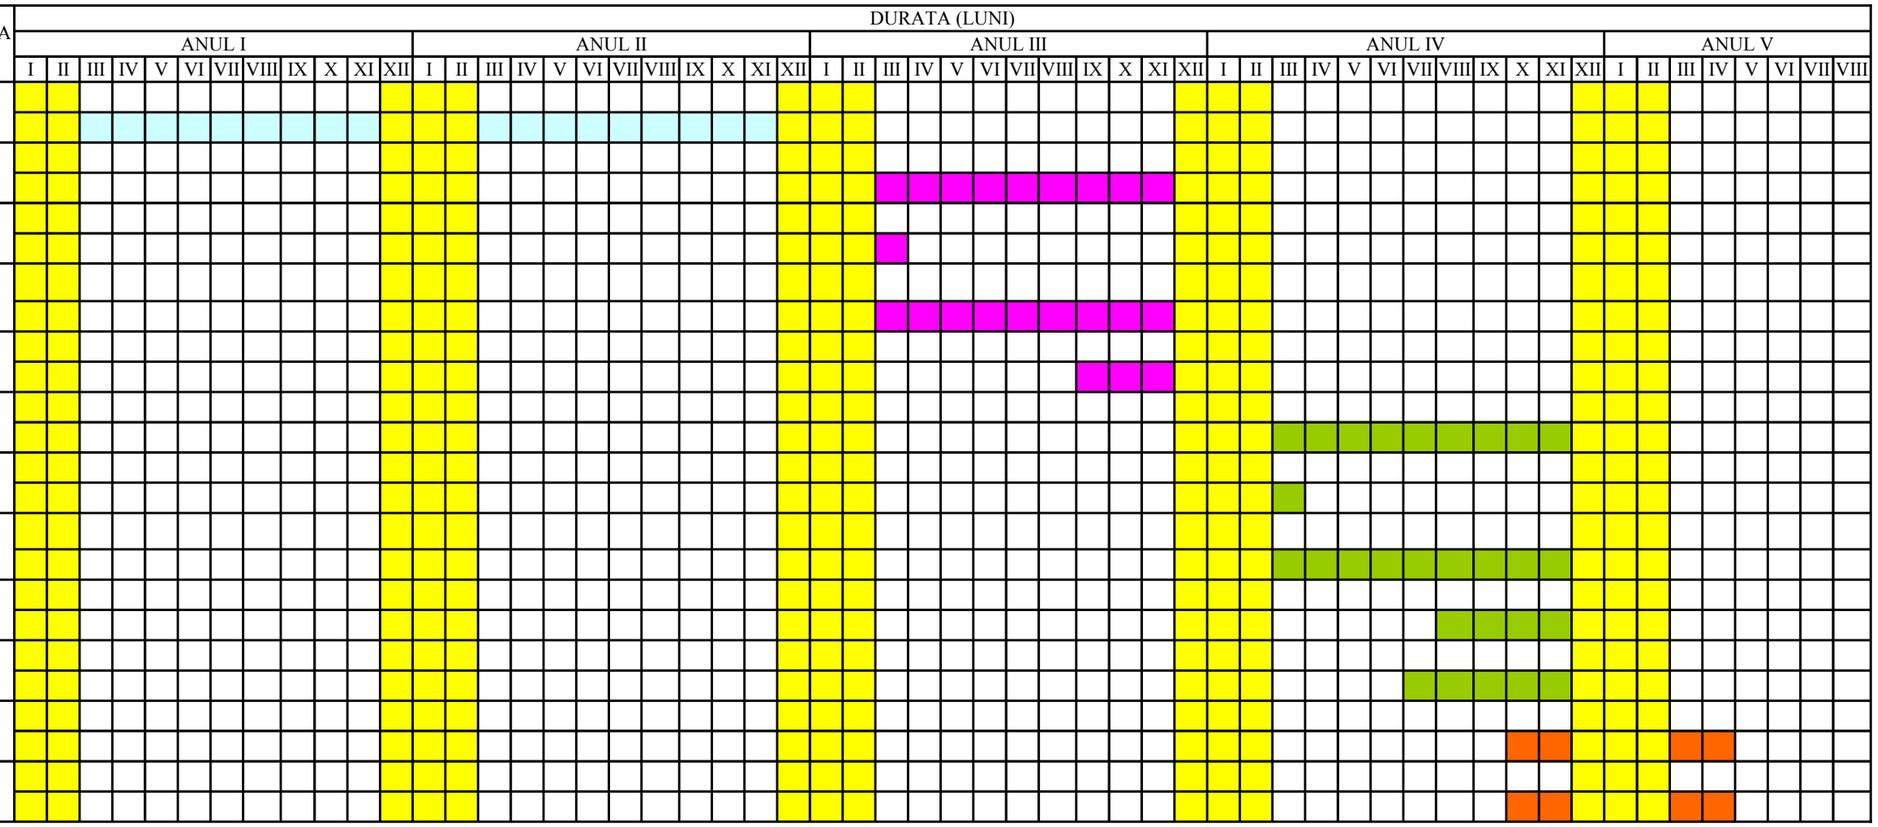

LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.
