ELEVATIE Sc. 1:250



VEDERE PLANA

Sc. 1:250

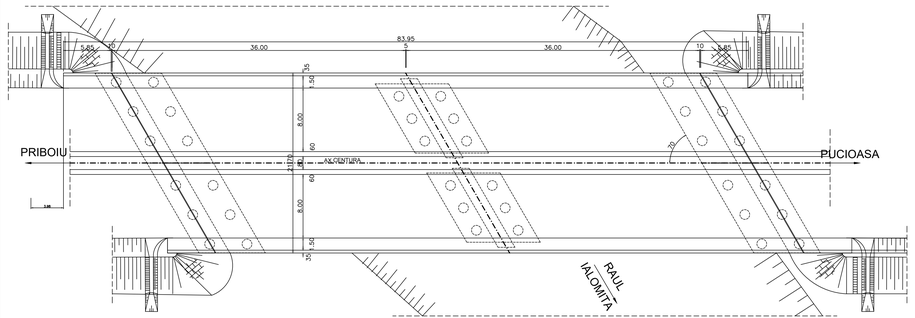

SECTIUNE TRANSVERSALA A-A

Sc. 1:100

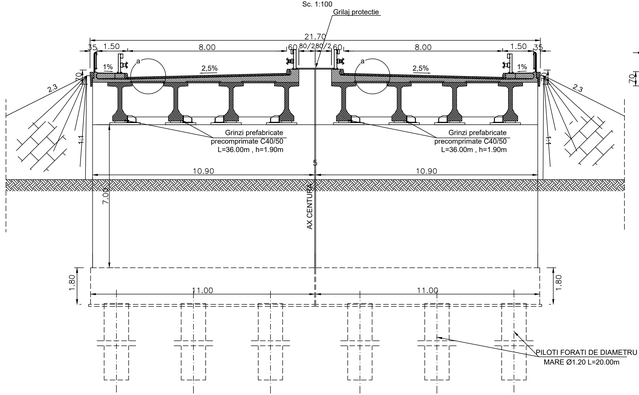

SECTIUNE TRANSVERSALA B-B

Sc. 1:100

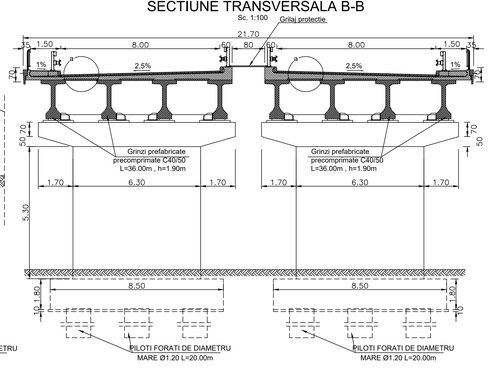

FISA FORAJULUI

Beneficiar: Consiliul Judetean Dambovita

Antreprenor S.C. VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.

Executant: INGENIERIE GEOMECANIQUE S.A.S.

Ingineriile de foraj/Coordonatele GPS 3D: (x) (y)
Cotă/Baza de măsură: Cantităţi în stratele sterile:
Data finalizării Foraj/cod:05.08.2022
Nivel hidrostatic: Nu
Adâncime rînd apa subteran/data măsurării:-4.30 m
Metoda de săpare: Carotaj în stratele sterile

Foraj nr: F56

Descrierea Litologica	Adancimea de la (m)	Adancimea pana la (m)	Grosimea stratului (m)	Adancimea apei (m)	Nr. probe
Umplut. sol vegetal, umed, dezvelit	0.00	1.20	1.20		
Argila prafoasa, vartoasa bolovanoasa, umeda	1.20	3.00	1.80		
Argila, fin, umed, dezvelit	3.00	5.90	2.90		
Argila prafoasa, vartoasa, umeda	5.90	13.20	7.30		
Nisip, fin, umed, dezvelit, vartos	13.20	15.00	1.80		
Argila prafoasa, vartoasa, umeda	15.00	19.50	4.50		
Nisip, umed, vartos	19.50	21.00	1.50		
Argila, umeda, vartoasa	21.00	27.00	6.00		

FISA FORAJULUI

Beneficiar: Consiliul Judetean Dambovita

Antreprenor S.C. VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.

Executant: INGENIERIE GEOMECANIQUE S.A.S.

Ingineriile de foraj/Coordonatele GPS 3D: (x) (y)
Cotă/Baza de măsură: Cantităţi în stratele sterile:
Data finalizării Foraj/cod:05.08.2022
Nivel hidrostatic: Nu
Adâncime rînd apa subteran/data măsurării:-4.30 m
Metoda de săpare: Carotaj în stratele sterile

Foraj nr: F57

Descrierea Litologica	Adancimea de la (m)	Adancimea pana la (m)	Grosimea stratului (m)	Adancimea apei (m)	Nr. probe
Umplut. sol vegetal, umed, dezvelit	0.00	1.20	1.20		
Argila prafoasa, vartoasa bolovanoasa, umeda	1.20	3.00	1.80		
Argila, fin, umed, dezvelit	3.00	5.90	2.90		
Argila prafoasa, vartoasa, umeda	5.90	13.20	7.30		
Nisip, fin, umed, dezvelit, vartos	13.20	15.00	1.80		
Argila prafoasa, vartoasa, umeda	15.00	19.50	4.50		
Nisip, umed, vartos	19.50	21.00	1.50		
Argila, umeda, vartoasa	21.00	27.00	6.00		

Detaliul "a"

CLASA DE INCARCARE : CONVOAIE DE CALCUL CONFORM SR EN 1991-2
CATEGORIA DE IMPORTANTA PRIVIND CALITATEA : "B"
EXIGENTA DE CALITATE : A4, B2, D
ZONA SEISMICA : γ_I CONFORM SR 11100/1-93
a_g=0.30g, T_C=0.7, CONFORM P100-1/2006

Beneficiar:	Proiectant:	Contract nr: 110/785 23.03.2022	Proiect nr.: 282/2022	Faza: Studiu de Fezabilitate	Data: 06.2022	Amplasament: Judeţul Dâmboviţa	CLASA TEHNICA: II CATEGORIA DE IMPORTANTA: B

CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVIŢA
Piata Tricolorului, Nr.1
Targoviste, DÂMBOVIŢA
Email: consiliu@cjdb.ro
Tel.: 0245-207600

ASOCIEREA:
VIA CARPATIA CONSULT SRL (lider de asociere)
ING PROIECT MANAGEMENT SRL
EAST WATER DRILLINGS SRL

Specificatie	Nume	Semnătura
Şef proiect	ING. VIOREL GIURA	
Proiectat	ING. MARIOS THEODOR	
Proiectat	ING. NICUŞOR POIANA	
Desenat	ING. RAZVAN ANDREI	
Verificat	ING. CRISTIAN BORDEI	

Scara:

Revizia:

"DRUM DE LEGĂTURĂ LA DRUMUL NAŢIONAL DN71 PENTRU ASIGURAREA OPTIMIZĂRII TRAFICULUI RUTIER ŞI ACCESIBILITĂŢII ÎN ZONELE URBANE ALE ORAŞELOR PUCIOASA ŞI FIENI"

Titlul planşei: **POD PE CENTURA PESTE RAUL IALOMITA LA KM 2+428.98 - DISPOZITIE GENERALA**

Planşa nr.: **DG03**
