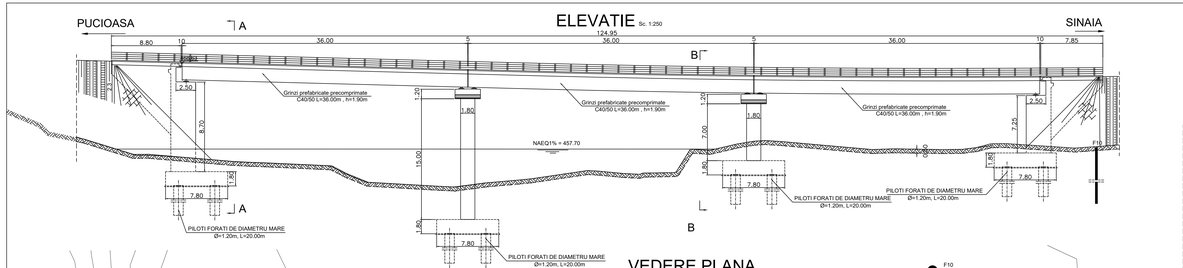


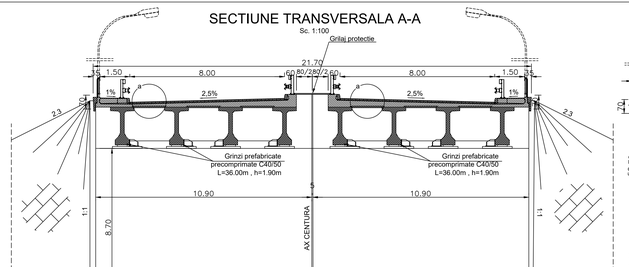


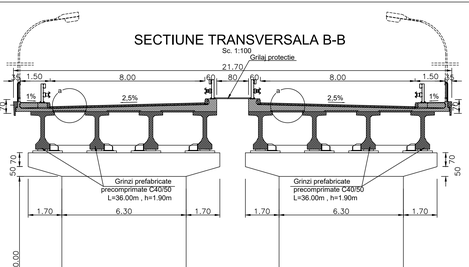


**FISA FORAJULUI**

Studiu Geotehnic pentru "Drum de legătură la drumul național DN71"

Inclinatia de foraj: Camasuho GEO 305
Coordonata Stereo 70: (x) (y)
Altitudine d.v.H.N.: 
Data Executarii foraj-ului:14.09.2022
Tipul forajului: Mecanic
Adancime nivel apa subteran/cota transarii:2,47 m
Metoda de sapare: Carotaj in sistem uscat

Antreprenor: VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.
Beneficiar: CLUB CONSULT INTERNATIONAL S.R.L.
Localitate: Jud. Dambovita
Foraj nr: F16

| Descriere Litologica | Cota talpa strat (m) | Grosime strat (m) | RQD (%) | Adancime SPT m | Nr. lovituri / 15cm | Nr. lovituri / 30cm | N60 | Nr. lovituri / 30cm x 1.2 | Nr. lovituri / 30cm x 1.2 x 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 0, Umplutura, Pamant vegetal | 0.00 | 1.30 | | | | | | | |
| Nivel, deschis | 1.30 | | | 1.5 | | | | | 4.5 |
| Nivel, umplutura | 1.30 | 4.00 | | | | | | | |
| | 5.30 | | | 3 | | | | | |
| Nivel, umplutura | 5.30 | 10.00 | | | | | | | |
| | 15.30 | | | 4.5 | | | | | |
| Nivel, deschis cu blocuri& rupt | 15.30 | 4.70 | | | | | | | |
| | 20.00 | | | 6 | | | | | |
| Nivel, umplutura | 20.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | 21.00 | | | 7.5 | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | |
| | | | | 10.5 | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | |
| | | | | 13.5 | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | |
| | | | | 16.5 | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | |
| | | | | 19.5 | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | |

Detaliul "a"

- 4cm MAS16
- 4cm BAP16
- 3cm BAS protectie
- Hidroizolatie
- Hidroizolatie
- Placa de suprabetonare beton armat
- Predala prefabricata beton armat

CLASA DE INCARCARE : CONVOAIE DE CALCUL CONFORM SR EN 1991-2
CATEGORIA DE IMPORTANTA PRIVIND CALITATEA : "B"
EXIGENTA DE CALITATE : A4, B2, D
ZONA SEISMICA : $T_c$ CONFORM SR 11100/1-93
$a_g$=0.30g, $T_c$=0.7, CONFORM P100-1/2006

ING. PROIECT MANAGEMENT SRL DAMBOVITA

| Beneficiar: | Proiectant: | Contract nr: 190/385 23.03.2022 | Proiect nr: 282/2022 | Faza: Studiu de Fezabilitate | Data: 06.2022 | Amplasament: Județul Dâmbovița | CLASA TEHNICA: II CATEGORIA DE IMPORTANTA: B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVIȚA<br>Piata Tricolorului, Nr.1<br>Targoviste, DÂMBOVIȚA<br>Email: cons@cjd.ro<br>Tel.: 0245-207600 | ASOCIEREA:<br>VIA CARPATIA CONSULT SRL<br>lider de asociere<br>ING PROIECT MANAGEMENT SRL<br>EAST WATER DRILLINGS SRL | Specificație | Nume | Semnătura | Scara: | "DRUM DE LEGĂTURĂ LA DRUMUL NAȚIONAL DN71 PENTRU ASIGURAREA OPTIMIZĂRII TRAFICULUI RUTIER ȘI ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONELE URBANE ALE ORAȘELOR PUCIOASA ȘI FIENI" | |
| | | Șef proiect | ING. VIOREL GURA | | | | |
| | | Proiectat | ING. MARIUS THEODOR | | | | |
| | | Proiectat | ING. NICUSOR POIANA | | | | |
| | | Desenat | ING. RAZVAN ANDREI | | Revizia: | Titlul planșei: PASAJ PE CENTURA PESTE RAUL IALOMITA LA KM 12+111.40 - DISPOZITIE GENERALA | Planșa nr: DG16 |
| | | Verificat | ING. CRISTIAN BORBELI | | | | |
